KASETSART UNIVERSITY

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY

SOIL BORING LOG

PROJECT	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	BORING STARTED	18 ก.ย. 2547
LOCATION	จ.ราชบุรี	BORING COMPLETED	23 ก.ย. 2547
BORING NO.	BH1	TOTAL DEPTH 15.0 m.	SURFACE ELEVATION - m.
DRILLER	-	INSPECTOR -	OBSERVATION WL. - m.
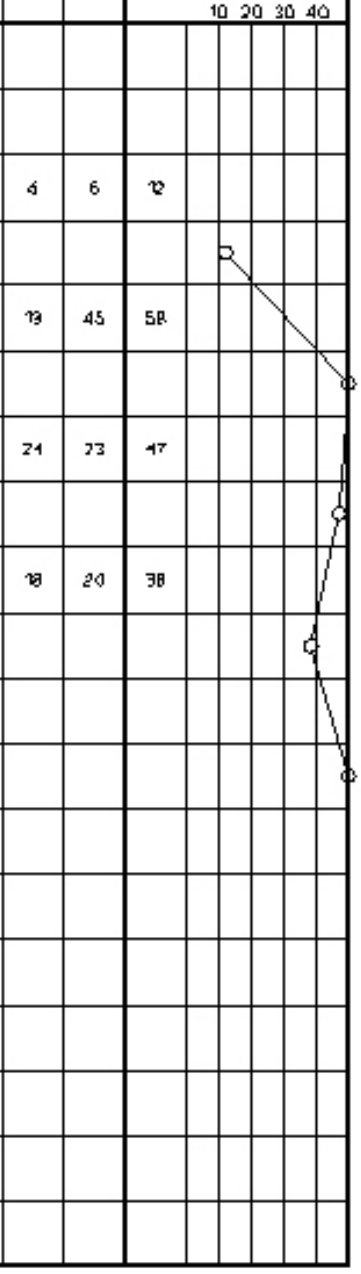
SOIL DESCRIPTION	DEPTH (m.)	GRAPHIC LOG	METHOD	SAMPLING & RECOVERY	SPT (Blow/ft.) 1st 6"	2nd 6"	3rd 6"	N
	0.0							
Medium SAND, brown	1.0							
	2.0				4	4	6	12
	3.0		WO					
Dense SAND, little gravel, brown	4.0				12	19	45	58
	5.0		WO					
	6.0				15	24	23	47
	7.0		WO					
	8.0				13	18	20	38
Dense silty fine SAND, reddish brown	9.0		WO					
	10.0				50/1"			
SHALE stone, reddish brown	11.0		WO					
	12.0							
	13.0		WO					
	14.0							
	15.0		WO					
Bottom of hole at 15.0 m	16.0							
	17.0							
	18.0
